


# Будгенплан на влаштування котлованів під фундаменти стовпчиків огорожі ділянки та стійок металоконструкцій екскаватором JCB 8016CTS

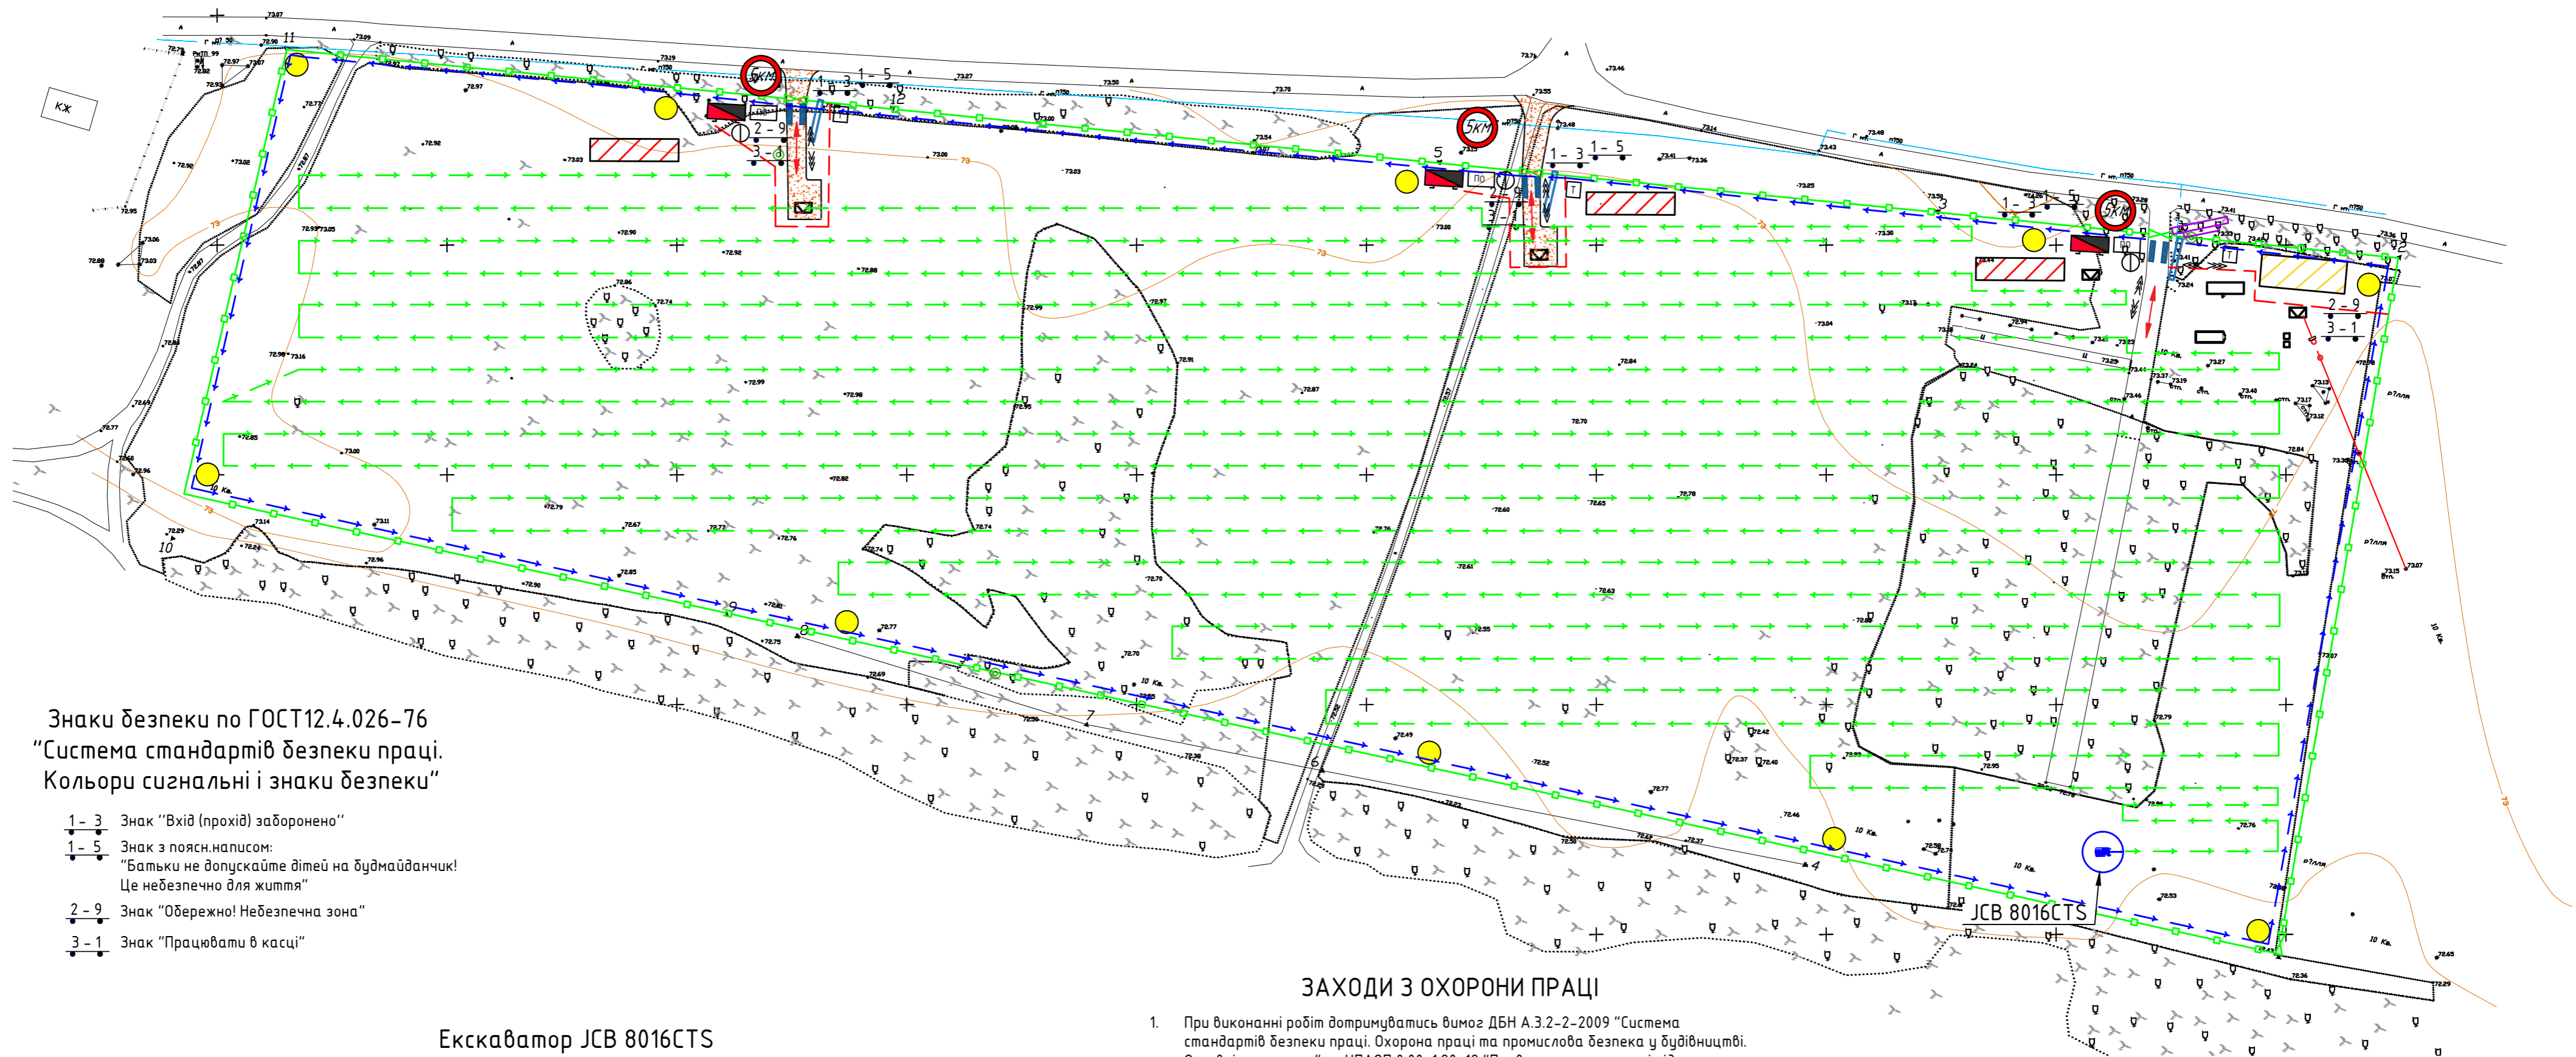

Знаки безпеки по ГОСТ12.4.026-76  
"Система стандартів безпеки праці.  
Кольори сигнальні і знаки безпеки"

- 1-3 Знак "Вхід (прохід) заборонено"
- 1-5 Знак з поясн.написом:  
"Батьки не допускайте дітей на будмайданчик!  
Це небезпечно для життя"
- 2-9 Знак "Обережно! Небезпечна зона"
- 3-1 Знак "Працювати в касці"

Екскаватор JCB 8016CTS



### Характеристики екскаватора

Радіус повороту задньої частини платформи, мм	1028
Швидкість повороту платформи, об/хв.	10
Висота копання, мм	3393/3494
Поворот стріли вліво/вправо, град.	55/75
Максимальний радіус копання, мм	3837/3933

### УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- в'їзні ворота
- Пост миття коліс
- напрямку руху екскаватора JCB 8016CTS при влаштуванні котлованів під фундаменти стовпчиків огорожі ділянки
- приміщення охорони
- Місця тимчасового складування матеріалів
- пожежний щит
- напрямку руху екскаватора JCB 8016CTS при влаштуванні котлованів під стійки металоконструкцій
- освітлювальні вежі
- Інформаційний щит
- місцезнаходження водія при вантажно-розвантажувальних операціях
- місце розташування підготовчих споруд
- знак обмеження швидкості
- туалет
- місце розташування водія при вантажно-розвантажувальних операціях
- інвентарна огорожа зон постійно діючих і потенційно небезпечних виробничих факторів
- напрямку руху автотранспорту "вперед-назад"
- Тимчасові дороги з щедно або плит
- схема руху автотранспорту по будівельному майданчику
- напрямку руху робітників
- тимчасове огородження згідно ДСТУ Б В.2.8-43:2011

### ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

- При виконанні робіт дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення" та НПА ОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"
- На основні види загальнобудівельних робіт проектується технологічні карти, в яких детально розглянута технологія і організація будівельного процесу, графік трудового процесу, підбирається номенклатура машин і механізмів, інструменту та пристосувань українських та зарубіжних фірм для безпечного та якісного виконання робіт; техніка безпеки при виконанні даного виду робіт, вказуються небезпечні та шкідливі фактори при виконанні конкретних робіт, передбачаються заходи щодо попередження їх впливу на робітників.
- Заїзд та виїзд транспортних засобів на територію будівельного майданчика здійснюється по одному, у супроводі двох сигнальників, один з яких призначається старшим.
- Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об'єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м<sup>2</sup> / згідно НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки України".

### З ПВР ознайомлені:

Посада	П. І. Б.	№ порсв.	Дата	Підпис

№3915-ПВР											
Нове будівництво сонячної електростанції "СЕС "Хутірське" потужністю 3.5 МВт за адресою: село Хутірське, Петриківського району, Дніпропетровської області											
Зм.	Кіл.діл	Арк.	№ док.	Підп.	Дата						
ГІП	Мартинюк				2019						
Розробив	Тарасюк				2019						
Н. контроль	Мартинюк				2019						
Будгенплан на влаштування котлованів під фундаменти стовпчиків огорожі ділянки та стійок металоконструкцій екскаватором JCB 8016CTS					<table border="1"> <tr> <th>Стадія</th> <th>Аркуш</th> <th>Аркушів</th> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	Стадія	Аркуш	Аркушів	Р	1	2
Стадія	Аркуш	Аркушів									
Р	1	2									
ТОВ "ОСНОВИ БЕЗПЕКИ"											
