


# Буденплан на виконання робіт навантажувачем JCB 550-80 WASTEMASTER

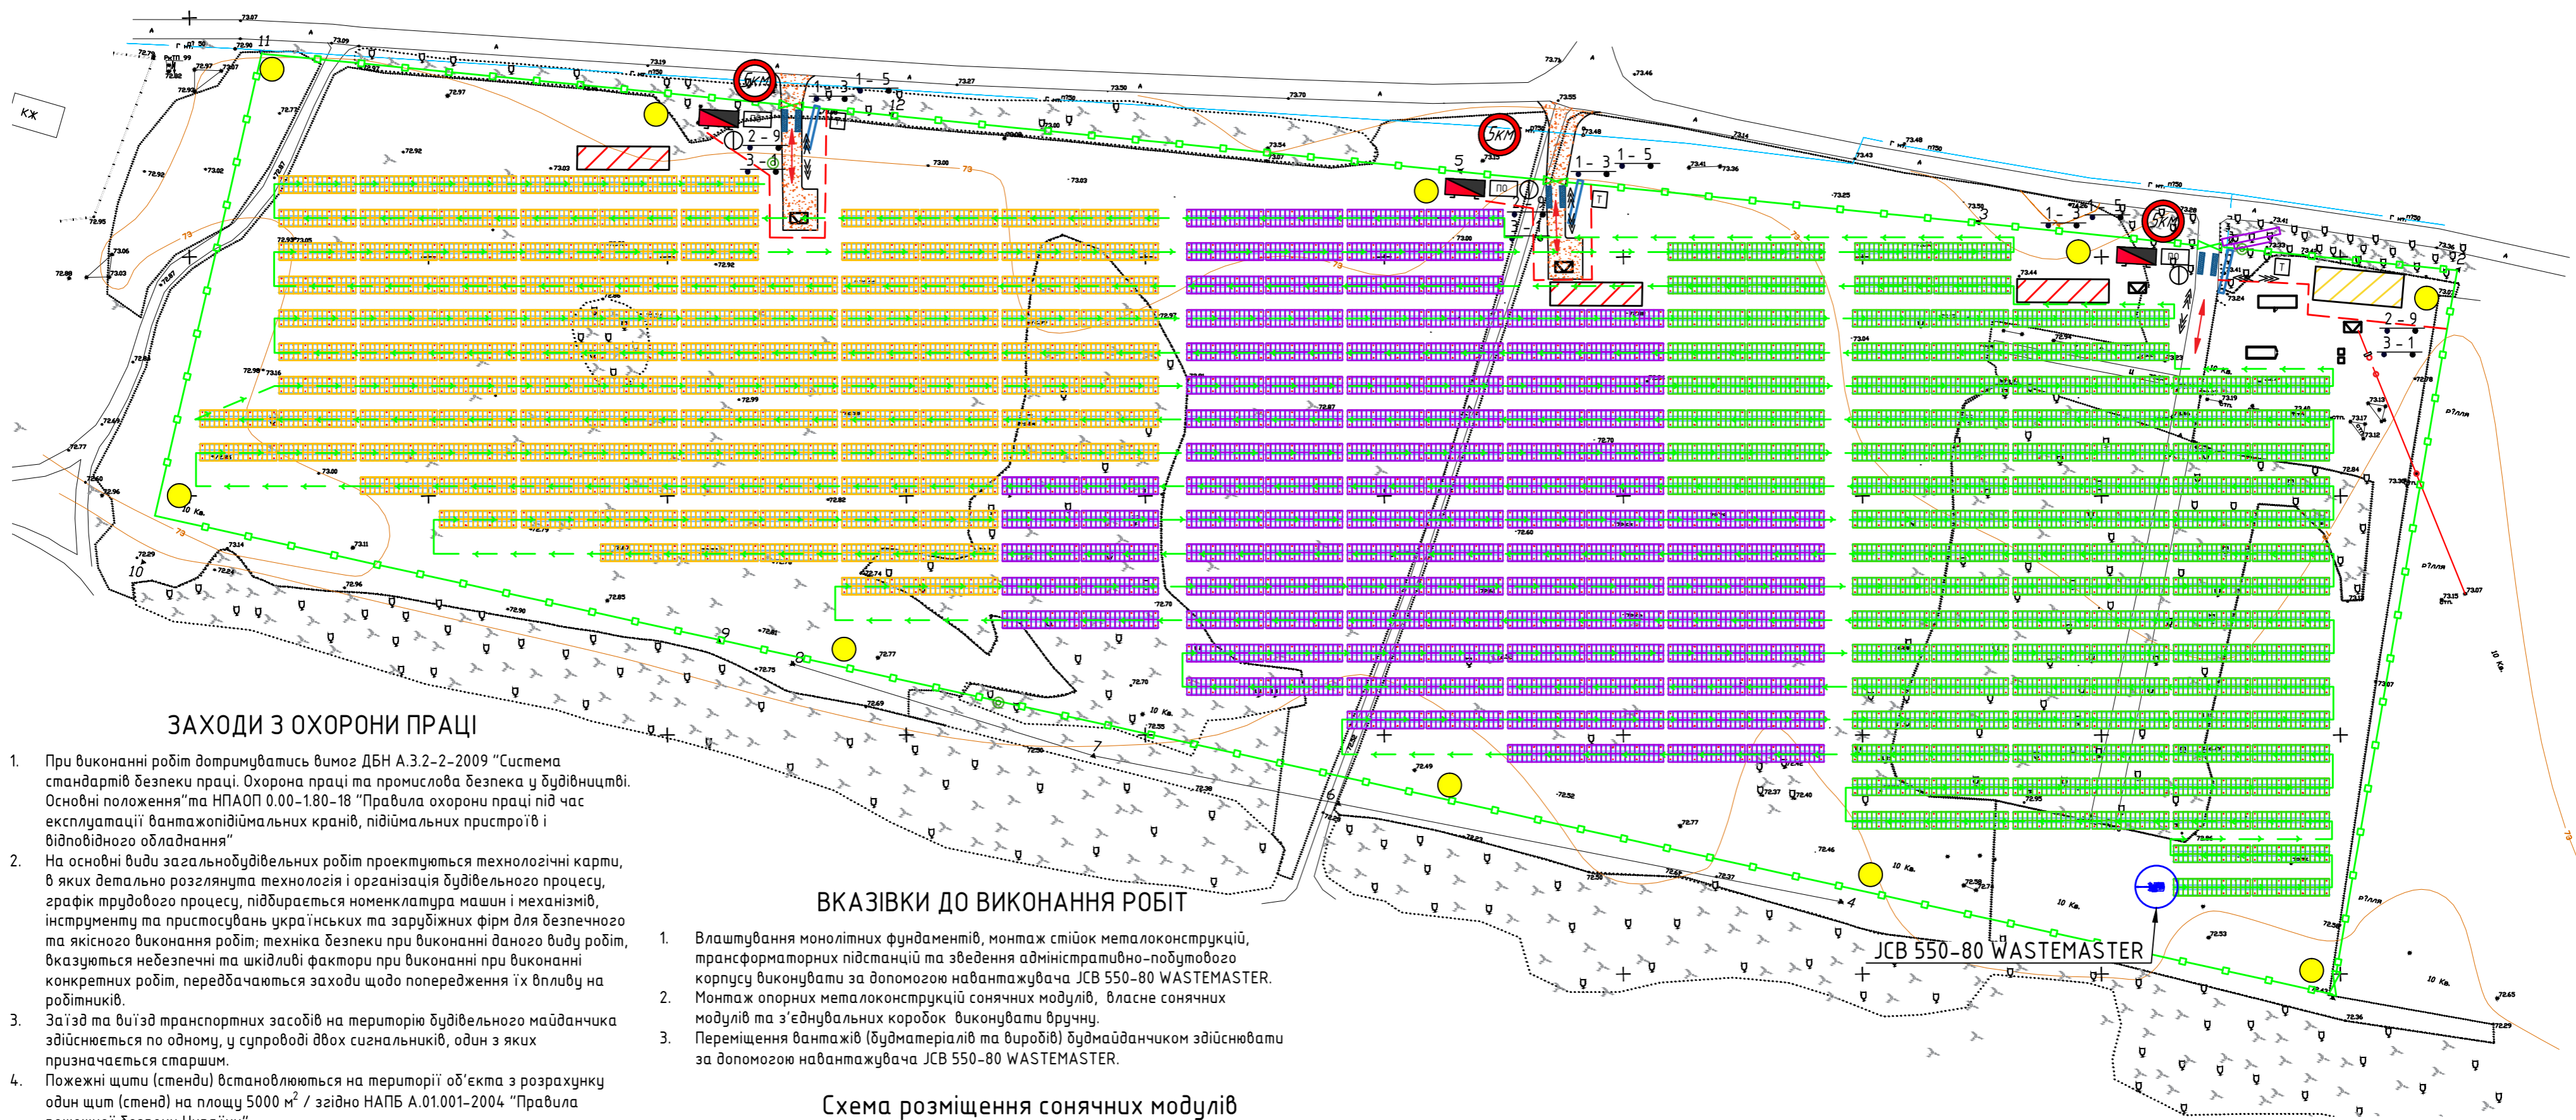


## ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

- При виконанні робіт дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення" та НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"
- На основні види загальнобудівельних робіт проектується технологічні карти, в яких детально розглянута технологія і організація будівельного процесу, графік трудового процесу, підбирається номенклатура машин і механізмів, інструменту та пристосувань українських та зарубіжних фірм для безпечного та якісного виконання робіт; техніка безпеки при виконанні даного виду робіт, вказуються небезпечні та шкідливі фактори при виконанні при виконанні конкретних робіт, передбачаються заходи щодо попередження їх впливу на робітників.
- Заїзд та виїзд транспортних засобів на територію будівельного майданчика здійснюється по одному, у супроводі двох сигнальників, один з яких призначається старшим.
- Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об'єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м<sup>2</sup> / згідно НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки України".

## ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Влаштування монолітних фундаментів, монтаж стійок металокаркасних, трансформаторних підстанцій та зведення адміністративно-побутового корпусу виконувати за допомогою навантажувача JCB 550-80 WASTEMASTER.
- Монтаж опорних металокаркасних сонячних модулів, власне сонячних модулів та з'єднувальних коробок виконувати вручну.
- Переміщення вантажів (будматеріалів та виробів) будмайданчиком здійснювати за допомогою навантажувача JCB 550-80 WASTEMASTER.

## Схема розміщення сонячних модулів

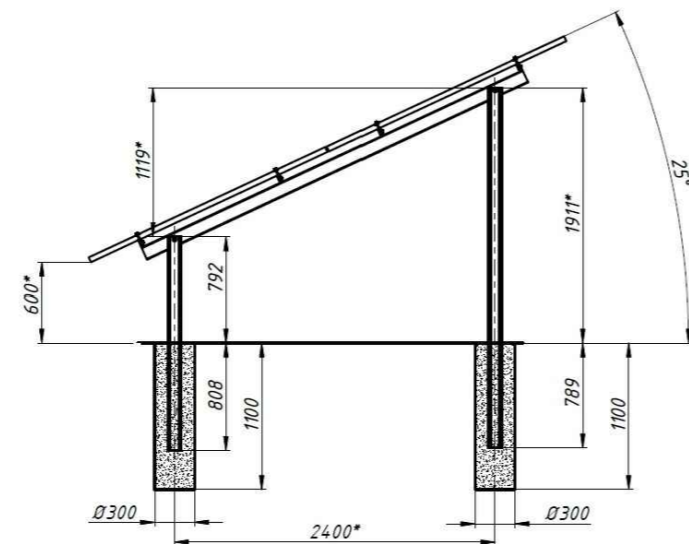

## Навантажувач JCB 550-80 WASTEMASTER



Максимальна висота підйому, м	8,1
Максимальна вантажопід'ємність, т	5
Максимальна потужність двигуна, кВт	93

## Знаки безпеки по ГОСТ 12.4.026-76 "Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні і знаки безпеки"

- 1-3 Знак "Вхід (прохід) заборонено"
- 1-5 Знак з поясн. написом: "Батьки не допускайте дітей на будмайданчик! Це небезпечно для життя"
- 2-9 Знак "Обережно! Небезпечна зона"
- 3-1 Знак "Працювати в касці"

## З ПВР ознайомлені:

Посада	П. І. Б.	№ порсв.	Дата	Підпис

## УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- В'їзні ворота
- Місця тимчасового складування матеріалів
- Інформаційний щит
- туалет
- Пост миття коліс
- пожежний щит
- місцезнаходження водія при вантажно-розвантажувальних операціях
- схема руху автотранспорту по будівельному майданчику
- напрямок руху навантажувача JCB 550-80 WASTEMASTER
- місце розташування побутових споруд
- інвентарна огорожа зон постійно діючих і потенційно небезпечних виробничих факторів
- напрямок руху робітників
- тимчасове огороження згідно ДСТУ Б В.2.8-43:2011
- ПО - приміщення охорони
- освітлювальні вежі
- знак обмеження швидкості
- напрямок руху автотранспорту "вперед-назад"
- асфальтована дорога

Зм.	Кіл.діл	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	№3915-ПВР		
ГІП	Мартинюк				2019	Нове будівництво сонячної електростанції "СЕС "Хутірське" потужністю 3.5 МВт за адресою: село Хутірське, Петриківського району, Дніпропетровської області		
Розробив	Тарасюк				2019	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н. контроль	Мартинюк				2019	Р	2	2
Буденплан на виконання робіт навантажувачем JCB 550-80 WASTEMASTER						ТОВ "ОСНОВИ БЕЗПЕКИ"		
